


ニューマチックケーソン年度毎実績表

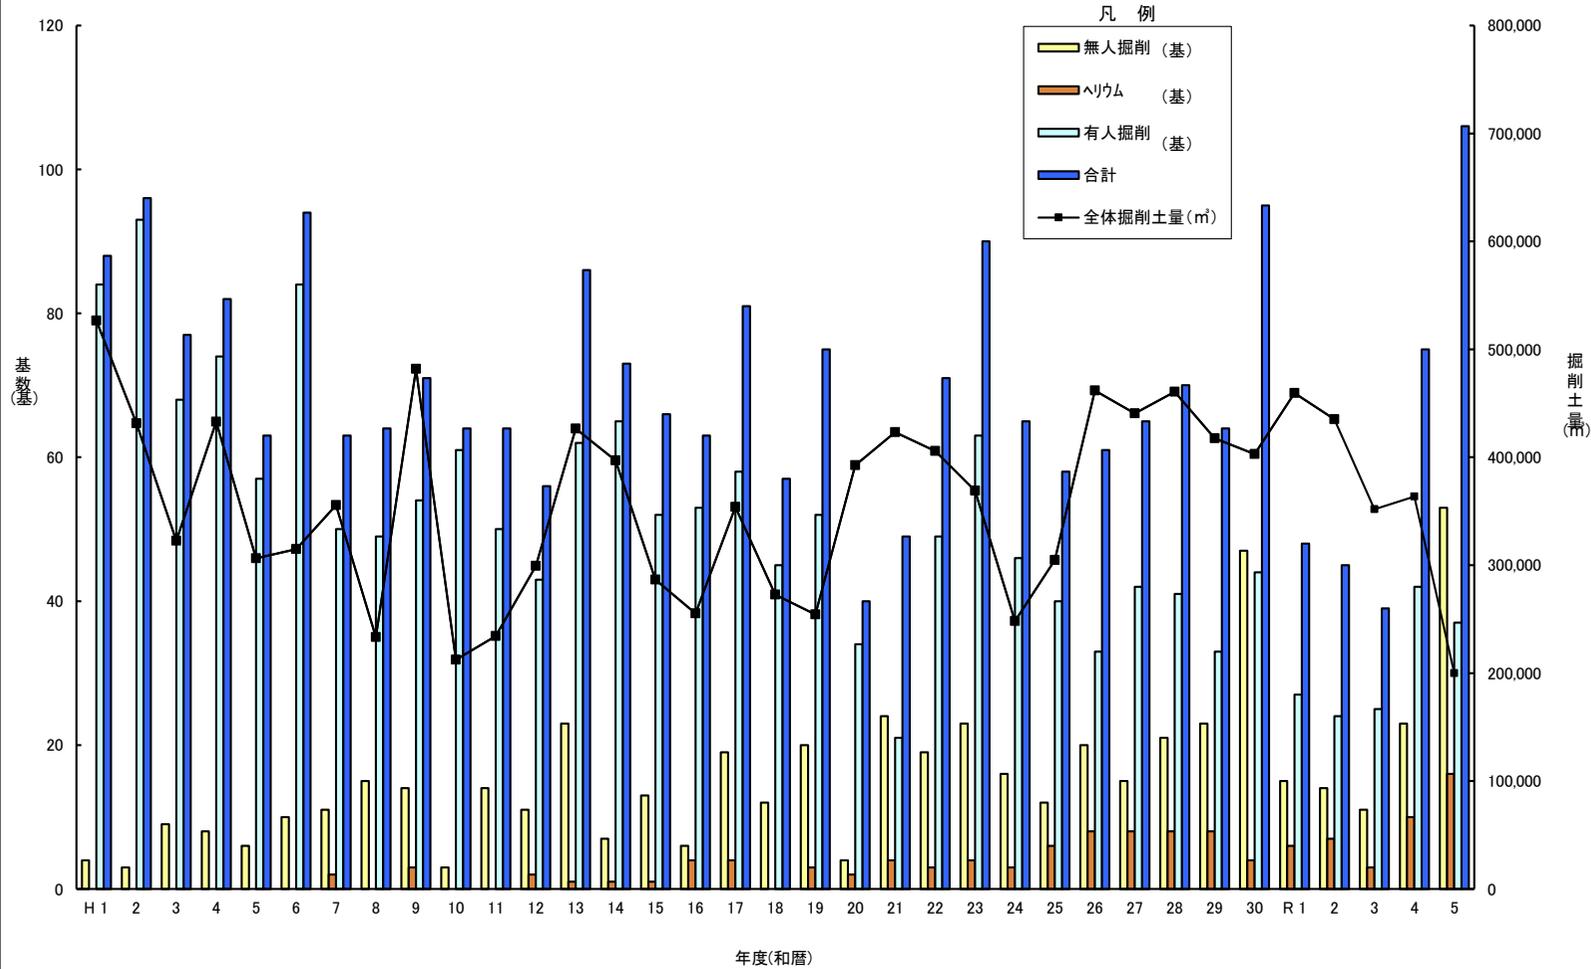

※無人掘削: 無人化ニューマチックケーソン工法
 ※ヘリウム: ヘリウム混合ガス利用無人化ニューマチックケーソン工法
 ※掘削土量は守秘義務工事を除く

ニューマチックケーソン有人・無人実績表

年度	掘削基数				全体掘削土量(m ³)
	無人掘削	ヘリウム	有人掘削	合計	
H 1	4	0	84	88	526,500
2	3	0	93	96	431,500
3	9	0	68	77	322,500
4	8	0	74	82	432,800
5	6	0	57	63	306,400
6	10	0	84	94	314,900
7	11	2	50	63	355,500
8	15	0	49	64	233,300
9	14	3	54	71	481,900
10	3	0	61	64	212,400
11	14	0	50	64	234,300
12	11	2	43	56	299,400
13	23	1	62	86	426,400
14	7	1	65	73	397,100
15	13	1	52	66	286,600
16	6	4	53	63	255,200
17	19	4	58	81	354,000
18	12	0	45	57	272,600
19	20	3	52	75	254,300
20	4	2	34	40	392,600
21	24	4	21	49	423,175
22	19	3	49	71	405,675
23	23	4	63	90	369,002
24	16	3	46	65	248,121
25	12	6	40	58	304,716
26	20	8	33	61	461,920
27	15	8	42	65	440,534
28	21	8	41	70	460,627
29	23	8	33	64	417,553
30	47	4	44	95	402,845
R 1	15	6	27	48	459,470
2	14	7	24	45	435,076
3	11	3	25	39	351,926
4	23	10	42	75	363,540
5	53	16	37	106	199,818
累計	548	121	1,755	2,424	12,534,198

(日本圧気技術協会 実績データより)
